

MD1

## TOP: 11 Informationen zum Sachstand im Projekt "Wasserversorgung Obere Kyll"

### 1. BA: Neubau Hochbehälter Schüller

03/2020



VERBANDSGEMEINDE GEROLSTEIN  
Gerolstein | Hillesheim | Obere Kyll



#### Baufortschritt:

- Baubeginn 08/2018
- Inbetriebnahme 06/2020
- Fertigstellung Bepflanzung, Zaun und Wegebau in 10/2020,



## TOP: 11 Informationen zum Sachstand im Projekt "Wasserversorgung Obere Kyll"

### 1. BA: Neubau Hochbehälter Schüller



#### Baufortschritt:

- Baubeginn 08/2018
- Inbetriebnahme 06/2020
- Fertigstellung Bepflanzung, Zaun und Wegebau in 10/2020,



## TOP: 11 Informationen zum Sachstand im Projekt "Wasserversorgung Obere Kyll"

### 2. BA Los 1+2 Trinkwassertransportleitung HB Schüller – HB Lissendorf (Fa. Backes Bau & Transporte, Stadtkyll)



#### Baufortschritt:

- 4 Leitungen parallel (Los1)
- Verlegung auf 300m bis 4,80m tief (Los1)
- 2 Leitungen parallel (Los2) in Regeltiefe
- 5.510m von 11.910m insgesamt verlegt
- Spülung/Desinfektion erfolgt derzeit (Los1)
- anschließend Wiederherstellung Wege Los1
- parallel Start des Leitungsbaus am HB Lissendorf (Los2)



## TOP: 11 Informationen zum Sachstand im Projekt "Wasserversorgung Obere Kyll"

### 2. BA Los 3: Trinkwasserleitung Anbindung Feriengebiet Tüschwieschen, Gönnersdorf (Fa. Basten, Niederstadtfeld)



#### Baufortschritt:


- Hauptleitung komplett verlegt (970m)
- Wiederherstellung Wege fertiggestellt
- Verlegung von zwei Hausanschlüssen nach Anschluss von Leitung Los 2 im Herbst 2020



## TOP: 11 Informationen zum Sachstand im Projekt "Wasserversorgung Obere Kyll"



### 1. / 3. BA: Trinkwassertransportleitung HB Hillesheim – PW Birgel (Fa. HTI, Daun)

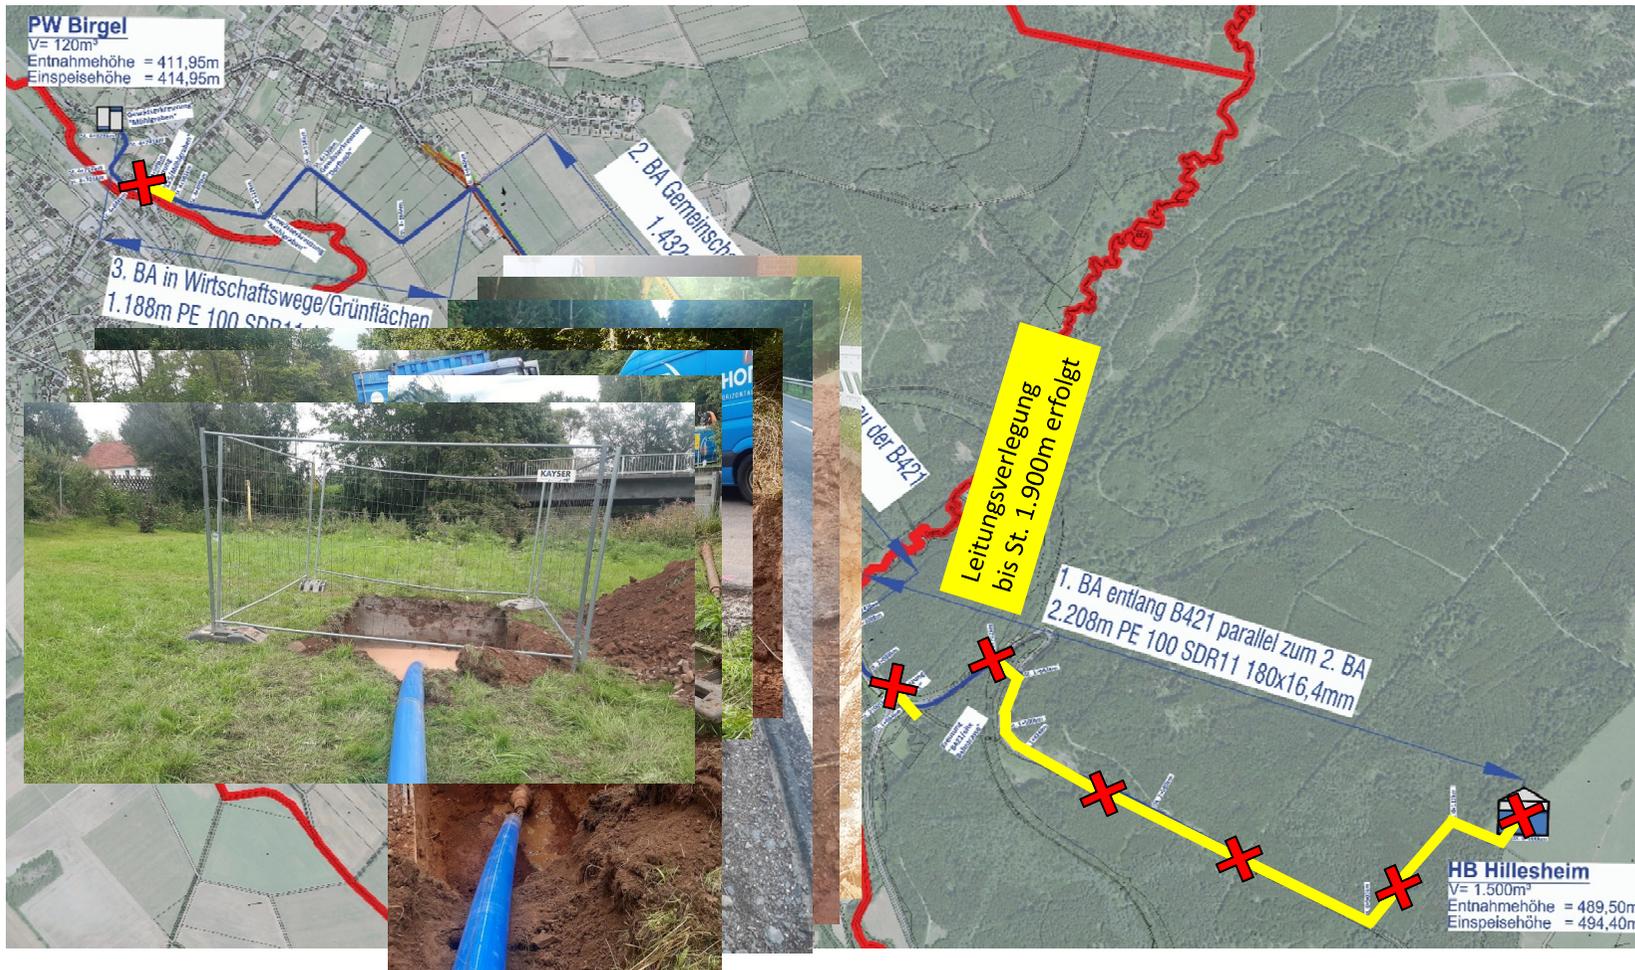

#### Baufortschritt:

- 1.900m von 3.400m Hauptleitung verlegt
- 1. BA in Kürze fertiggestellt
- vier Straßenkreuzungen im Spülbohrverfahren hergestellt
- Baubeginn im 3. BA in Kürze
- 2. BA mit Ausbau B421 (Gemeinschaftsmaßnahme LBM) Auftragsvergabe erfolgt in Kürze durch LBM




MD1

**TOP: 11 Informationen zum Sachstand im Projekt "Wasserversorgung Obere Kyll"**

VERBANDSGEMEINDE GEROLSTEIN  
Gerolstein | Hillesheim | Obere Kyll



# Fragen ?





## TOP: 11 Informationen zum Sachstand im Projekt "Wasserversorgung Obere Kyll"



### Baukosten

#### 1.-3. Bauabschnitt: Wasserversorgung Obere Kyll

| Bauabschnitt |  | Baukosten bisher<br>(Netto) | Baukostenschätzung<br>(Netto) | Differenz (Netto)       |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. BA:       | Neubau Hochbehälter Schüller (2018-2020) | 2.033.898,70 €              | 2.596.750,00 €                | - 562.851,30 €          |
| 2. BA:       | Leitungsbau + TA Pumpwerke (2020)        | 465.200,49 €                | 2.631.000,00 €                | - 2.165.799,51 €        |
| 3. BA:       | Leitungsbau (2021)                       | 56.199,30 €                 | 968.000,00 €                  | - 911.800,70 €          |
|              |  | <b>2.555.298,49 €</b>       | <b>6.195.750,00 €</b>         | <b>- 3.640.451,51 €</b> |

#### Erläuterungen zu Baukosten bisher:

- 1. BA: weitestgehend fertiggestellt, es stehen noch Schlussrechnungen aus
- 2. BA: noch im Bau befindlich
- 3. BA: Vorabverlegung (230m) im Zuge des Ausbaus von Straßen in Lissendorf 2017/2018

#### Trinkwassertransportleitung Hochbehälter Hillesheim – Pumpwerk Birgel

| Bauabschnitt |  | Baukosten bisher<br>(Netto) | Baukostenschätzung<br>(Netto) | Differenz (Netto)     |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. + 3. BA:  | Leitungsbau (im Bau)   | 120.773,65 €                | 576.000,00 €                  | - 455.226,35 €        |
| 2. BA:       | Leitungsbau im Ausbaubereich B421<br>(Gemeinschaftsmaßnahme mit LBM) | 2.520,48 €                  | 418.000,00 €                  | - 415.479,52 €        |
|              |  | <b>123.294,13 €</b>         | <b>994.000,00 €</b>           | <b>- 870.705,87 €</b> |

#### Erläuterungen zu Baukosten bisher:

- 1. + 3. BA: noch im Bau befindlich
- 2. BA: anteilige Nebenkosten

